





INFORME DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE QUEBRADAS

En fecha 17 de agosto del presente año se culminaron los trabajos de la obra de Reconstrucción de la Canalización del Cauce de la quebrada Chacaito, en el tramo adyacente a la quinta Mama ubicada al final calle Mohedano, urbanización El Country Club, Municipio Chacao. En inspección ocular se verificó la construcción de un muro de 21 metros de largo aproximadamente y 3 metros de alto, de concreto premezclado de FC 250 Kg/cm², con acero de refuerzo FY 4200KGF/cm², utilizando cabillas de igual o menor del N° 4 a 7 (D=1/2" a D=7/8"). Este es el producto final de una obra donde además se realizó la excavación de 40 m³ de tierra a mano para asiento de fundaciones y zanjas, 46 m² de acondicionamiento a mano de la superficie de apoyo, de espesor comprendido entre 10 y 15 cm y suministro y colación de piedra picada.




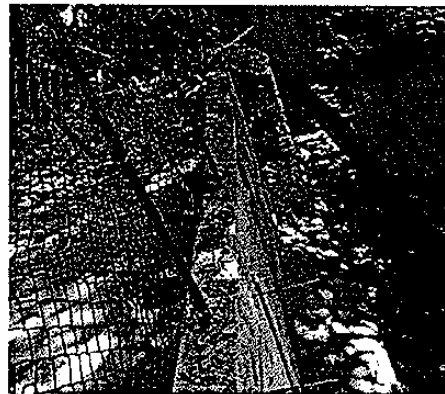

Igualmente en fecha 05 de Agosto del presente año, se verificó la culminación de los trabajos de estabilización de talud de tierra posterior a la quinta La Jaula de la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao, la remoción de escombros ubicados dentro del cauce de la quebrada Sebucán, en la calle 8-A con 5ta avenida, además de la instalación de 20 mts de malla ciclón para cerramiento de la vivienda antes mencionada. Con este trabajo se mitigó el riesgo de colapso o derrumbe total de este alud de tierra que generaría la obstrucción total del cauce de la quebrada.

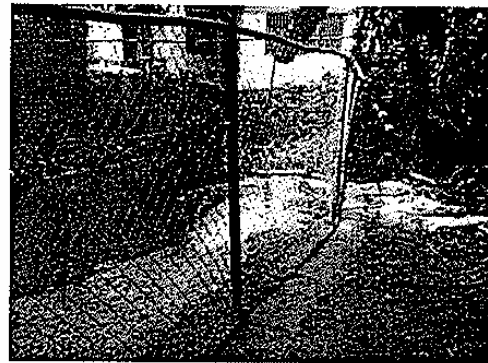

Se pudo constatar la ejecución total de dicha obra, cumpliendo así como los aspectos técnicos ingenieriles estipulados en los términos de referencia del contrato de Obras firmado. Cabe destacar que estos trabajos se comenzaron en fecha 19 de junio de 2013, cumpliendo igualmente con el lapso de tiempo programado para los mismos.


Ing. Johan Prieto

Director Ejecutivo de Protección Civil

